[Insertar logo Duoc UC]

PROYECTO LA PUERTA: MANUAL DE PROPUESTAS DE MEJORA

Qué hacer, quién, cuándo, con qué recursos y cómo saber si funcionó

Autor y docente responsable: Juan Antonio Carrasco Navarrete

Escuela de Administración y Negocios · Sede San Bernardo

Proyecto La Puerta · Producto G

Octubre de 2026

Elaborado con apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial (véase Anexos)

Índice

1. INTRODUCCIÓN..... 3

1.1 Tema, contexto y objetivos..... 3

1.2 Cómo usar este manual..... 3

2. DESARROLLO..... 5

2.1 Áreas prioritarias de mejora..... 5

2.2 A1 · Medición y evaluación..... 6

2.3 A2 · Redes profesionales..... 7

2.4 A3 · Contacto con el trabajo real..... 9

2.5 A4 · Acompañamiento focalizado..... 10

2.6 A5 · Competencias de empleabilidad..... 12

2.7 A6 · Gobernanza y mejora continua..... 13

2.8 Indicadores de seguimiento (tablero maestro)..... 15

2.9 Cronograma referencial..... 16

2.10 Estrategias de implementación..... 16

3. CONCLUSIÓN..... 18

3.1 Conclusión y próximos pasos..... 18

4. REFERENCIAS..... 19

5. ANEXOS..... 20

5.1 Plantillas y protocolos..... 20

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Tema, contexto y objetivos

Tema

Las acciones de mejora derivadas de los resultados de la encuesta del Proyecto La Puerta: qué hacer, quién, cuándo, con qué recursos y cómo medir el éxito.

Contexto

Los Informes A, B y C identificaron brechas (red de contactos, contacto con el trabajo real, estudiantes en semáforo rojo) y un vacío de medición. Este manual convierte esos hallazgos en acciones concretas para equipos con tiempo comprimido y presupuestos acotados.

Objetivos

Objetivo general. Proponer un plan de acción priorizado, con indicadores de seguimiento, cronograma y estrategias de implementación.

Objetivos específicos:

- Definir áreas prioritarias de mejora y su evidencia.
- Detallar acciones concretas con responsables, plazos y nivel de costo.
- Establecer indicadores, metas y cadencia de seguimiento.
- Proponer cronograma, gobernanza, riesgos y criterios para escalar.

Organización del texto

El documento se organiza en cinco partes: la Introducción (cómo usar el manual y principios de diseño); el Desarrollo (áreas prioritarias, fichas de acción por área, indicadores, cronograma y estrategias); la Conclusión; las Referencias; y los Anexos (plantilla de microproyecto, protocolo de evaluación y declaración de uso de IA).

1.2 Cómo usar este manual

Este manual traduce los hallazgos de los Informes A, B y C en **acciones concretas**. Cada una indica qué es, quién podría liderarla, en qué plazo, con qué nivel de costo y **cómo se medirá su éxito**. Está pensado

para equipos con **tiempo comprimido y presupuestos acotados**: privilegia actividades que se integran a asignaturas existentes y microproyectos de bajo costo.

Nivel de costo	Qué significa	Ejemplos
Bajo (≈ 0)	Usa horas ya contratadas; sin gasto adicional.	Rediseño de la encuesta, doble codificación, tutorías dentro de asignaturas.
Microproyecto (≤ $150.000 CLP)	Gasto menor por actividad (colación, materiales, difusión).	«Café con profesionales», entrevista informativa, taller breve.
Medio ($150.000–$600.000)	Requiere coordinación y algo de financiamiento.	Visita con transporte, mini-proyecto con empresa, jornada de ferias.
Mayor (> $600.000)	Requiere gestión institucional.	Licencias de software, cursos de idiomas adicionales.

Sobre las cifras de costo

Los niveles de costo son **estimaciones gruesas del equipo analista**, no cotizaciones. Deben validarse con la Dirección de Escuela y Administración de la sede antes de comprometer recursos. Los plazos asumen el calendario académico semestral.

Cuatro principios de diseño

1. **Empezar pequeño y medir:** cada acción nace como piloto con indicador y línea base.
2. **Integrar, no sumar:** vincular cada actividad a una asignatura y resultado de aprendizaje existente, para no sobrecargar a docentes ni estudiantes.
3. **Aprender haciendo (Kolb, 1984):** experiencia → reflexión → aplicación; toda actividad con empresas termina con una bitácora de aprendizaje.
4. **Focalizar por necesidad, no por rótulo:** usar el semáforo y las brechas específicas, no el hecho de tener o no práctica previa.

2. DESARROLLO

2.1 Áreas prioritarias de mejora

Los hallazgos se agrupan en **seis áreas**. Las ocho recomendaciones (R1 a R8) de los Informes A, B y C se reparten entre ellas.

Área	Recomendaciones	Brecha que atiende (línea base)	Prioridad
A1 · Medición y evaluación	R1 · R8	Código, momento, grupo, A03/A04 y POST_EXP1 vacíos o no aplicados; respuestas abiertas sin validar.	**Hacer ya**
A2 · Redes profesionales	R2	P12 = 41 % de acuerdo; P11 = 64 %.	**Estratégica**
A3 · Contacto con el trabajo real	R3	P01 = 68 %; P02 = 69 %; P09 = 62 %; P10 = 69 %.	**Estratégica**
A4 · Acompañamiento focalizado	R4 · R7	38 estudiantes en rojo (21 %); tramo 3.°–4.° semestre más bajo.	**Hacer ya**
A5 · Competencias de empleabilidad	R5 · R6	P04 = 68 %; P06 = 66 %; 20 menciones de inglés, 19 de herramientas.	**Ajuste / evaluar**
A6 · Gobernanza y mejora continua	Transversal	Sin responsables ni ciclo de revisión definidos.	**Hacer ya**



Figura 1. Matriz de priorización de las recomendaciones.

2.2 A1 · Medición y evaluación

Por qué esta área

Sin código único, momento y grupo no se puede evaluar el efecto de La Puerta; tampoco se aplicaron las preguntas A03 y A04 del Informe Metodológico ni POST_EXP1. Es la corrección más barata y la de mayor valor.

Objetivo. Poder responder, en la próxima aplicación, si La Puerta cambia la preparación percibida y el desempeño en práctica.

Acciones concretas

#	Acción	Qué es, concretamente	Responsable sugerido	Plazo	Costo
1.1	Campos obligatorios	En el formulario: código de estudiante (con validación de formato), momento (pretest/postest) y grupo (La Puerta/comparación) como preguntas **requeridas**; no mostrar el formulario sin estos datos.	Coordinación de investigación	Nov–Dic 26	Bajo
1.2	Completar el instrumento	Agregar A03 y A04 y hacer visible POST_EXP1 en el postest. Separar P15 (interés) de la dimensión de redes y renombrar D4 como «Redes».	Equipo de investigación	Dic 26	Bajo
1.3	Piloto con grupo de comparación	Aplicar La Puerta a secciones seleccionadas y usar secciones equivalentes (misma sede, semestre y carrera) como comparación; pretest en las primeras semanas y postest al cierre del semestre.	Dirección de Escuela + jefaturas	Mar–Jul 27	Bajo
1.4	Evaluación de tutor	Incorporar la rúbrica Likert de 5 puntos del informe metodológico para que el tutor de empresa evalúe el desempeño observado.	Coordinación de práctica	Jun–Jul 27	Bajo
1.5	Validar respuestas abiertas	Doble codificación humana con libro de códigos; acuerdo entre codificadores (kappa ≥ 0,70).	Dos docentes	Nov 26	Bajo
1.6	Registrar el plan de análisis	Dejar escritas, antes de aplicar, las hipótesis y reglas de decisión (como en el Informe B).	Equipo de investigación	Feb 27	Bajo

Beneficios esperados

- Se podrá atribuir (o no) cambios al programa con grupo de comparación.
- Se detectarán diferencias reales de 0,2–0,3 puntos si el tamaño de muestra es adecuado (≈ 110 por grupo; ver Anexo B).
- Se comparará lo que los estudiantes creen de sí mismos con lo que observa el tutor.
- Se tomarán decisiones de escalamiento con evidencia.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Línea base	Meta (2 semestres)	Cómo se mide
% de registros con código, momento y grupo	0 %	100 %	Revisión de la base tras cada aplicación
Emparejamiento pretest–postest	No medible	≥ 70 % de los participantes	Códigos presentes en ambas mediciones
Acuerdo de codificación (kappa)	No medido	≥ 0,70	Doble codificación de una muestra
Cobertura de evaluación de tutor	0 %	≥ 60 % de practicantes	Rúbricas recibidas

Riesgos y cómo mitigarlos

Riesgo	Mitigación
Baja tasa de respuesta en el postest	Aplicarlo en clase (15 minutos); recordatorios; vincular a una actividad de cierre.
Contaminación del grupo de comparación	Asignar por sección completa; evitar mezclar actividades entre secciones.
Privacidad (códigos, correos)	Usar códigos seudonimizados, separar la tabla de equivalencias y guardarla con acceso restringido; cumplir la normativa chilena de protección de datos personales.

Estrategia de implementación

Comenzar en noviembre con los cambios del formulario (costo cero). Probar con 10 estudiantes antes de la aplicación masiva. El analista de datos reutiliza los scripts del repositorio para generar el informe en el mismo día del cierre.

2.3 A2 · Redes profesionales

Por qué esta área

Solo 41 % dice tener una red de contactos laborales y 64 % sabe cómo contactar a profesionales. La brecha es transversal (con y sin práctica previa, todos los años) y los estudiantes quieren vincularse (P15 = 83 %). Los vínculos con personas fuera del círculo cercano son un recurso clave de información y empleo (Granovetter, 1973).

Objetivo. Que cada estudiante llegue a su práctica con al menos tres contactos profesionales de su área y la confianza para contactar a más.

Acciones concretas

#	Acción	Qué es, concretamente	Responsable sugerido	Plazo	Costo
2.1	Café con profesionales	Encuentro mensual de 45 minutos con egresados, practicantes o profesionales de empresas socias; formato de conversación guiada y espacio para preguntas.	Coordinación de carrera + Vinculación con el Medio	Mar–Jul 27	Microproyecto
2.2	Mentoría entre pares	Estudiantes de 5.° semestre o más (con práctica) acompañan a estudiantes de 1.°–2.°; 3 encuentros por semestre (peer-mentoring).	Docentes tutores	Mar–Jul 27	Bajo
2.3	Entrevista informativa	Tarea evaluada en una asignatura: cada estudiante entrevista a un profesional de su rubro con una pauta (qué hace, qué exige, cómo llegó) y entrega un breve informe.	Docente de asignatura	Abr–Jun 27	Bajo
2.4	Taller «Cómo contactar a un profesional»	2 horas: guion de presentación, mensaje por correo y LinkedIn, qué preguntar y cómo agradecer; práctica con role-playing.	Docente de comunicación	Abr 27	Bajo
2.5	Directorio de contactos	Base interna de egresados y empresas socias dispuestos a conversar, con consentimiento informado y actualización semestral.	Vinculación con el Medio	Dic 26–Mar 27	Bajo
2.6	Charlas o feria por rubro	Una jornada por semestre con 4–6 empresas (logística, comercio exterior, finanzas, RR. HH.).	Dirección de Escuela	Jun 27	Medio

Beneficios esperados

- Más contactos y mayor confianza para pedir información o una práctica.
- Acceso a información realista sobre tareas y exigencias (también mejora P01 y P02).
- Fortalecimiento de la relación con empresas socias y egresados.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Línea base	Meta (2 semestres)	Cómo se mide
P12 · Tengo una red de contactos referentes	41 %	≥ 60 % de acuerdo	Encuesta pre/post
P11 · Sé cómo contactar a profesionales	64 %	≥ 72 % de acuerdo	Encuesta pre/post
Contactos profesionales registrados por estudiante	No medido	≥ 3	Bitácora / entrevista informativa
Estudiantes que participan en ≥ 1 actividad de redes	No medido	≥ 70 %	Listas de asistencia

Riesgos y cómo mitigarlos

Riesgo	Mitigación
Baja disponibilidad de profesionales	Formatos cortos (45 min), virtuales cuando se requiera; rotar entre egresados.
Que las redes dependan de pocas personas	Diversificar rubros y empresas; no más de 2 encuentros con la misma persona por semestre.

Riesgo	Mitigación
Uso indebido de datos de contacto	Consentimiento explícito y uso exclusivo para fines formativos.

Estrategia de implementación

Partir con una sola carrera como piloto y un solo rubro. El «café» es un microproyecto: colación y difusión no deberían superar los $150.000 por sesión. La entrevista informativa no tiene costo y puede evaluarse con la rúbrica existente de la asignatura.

2.4 A3 · Contacto con el trabajo real

Por qué esta área

Conocer tareas y exigencias (P01 = 68 %; P02 = 69 %) y haber contrastado el trabajo con los intereses (P09 = 62 %) están bajo la meta, y se asocian con sentirse seguro de adaptarse (R^2 ≈ 49 %). En sus palabras, lo más pedido son simulaciones, casos reales y salidas a terreno. Entre quienes no han hecho práctica, 13 de 15 que dicen «no tener aprendizaje laboral» son estudiantes sin práctica previa.

Objetivo. Que todo estudiante tenga, antes de su práctica, al menos una vivencia concreta del trabajo real y una reflexión escrita sobre ella.

Acciones concretas

#	Acción	Qué es, concretamente	Responsable sugerido	Plazo	Costo
3.1	Visitas guiadas con pauta	Dos visitas por semestre a centros de distribución, puertos u oficinas; con guía de observación (tareas, herramientas, roles) y breve puesta en común.	Jefaturas de carrera	Abr–Jun 27	Medio
3.2	Simulación de la práctica	Role-play de entrevista, primer día y conversación con jefatura, con retroalimentación de docentes o empresas socias; incluye casos de dudas y errores.	Docentes de comunicación y práctica	Abr–Jun 27	Bajo
3.3	Mini-proyecto con empresa	Desafío real acotado (2–4 semanas) planteado por una empresa socia, resuelto por equipos y presentado a la empresa.	Docentes + empresa socia	May–Jul 27	Medio
3.4	Jornada de observación (shadowing)	Una jornada acompañando a un profesional; registro de tareas, decisiones y preguntas.	Coordinación de práctica	Jun–Jul 27	Bajo
3.5	Bitácora de aprendizaje	Registro de una página tras cada actividad: qué vi, qué me sorprendió, qué quiero preguntar, qué cambiaría; reflexión al estilo del ciclo de Kolb (1984).	Todos los docentes	Todo el semestre	Bajo
3.6	Casos reales de docentes con experiencia	Incorporar en clase situaciones vividas por docentes y egresados (por ejemplo, el uso de descriptores de cargo en reclutamiento).	Docentes	Todo el semestre	Bajo

Beneficios esperados

- Expectativas más realistas, menor shock de transición.
- Mayor seguridad de adaptarse a un puesto (P10).
- Estudiantes sin práctica previa con experiencias concretas que contar.
- Mejor retroalimentación para ajustar contenidos de asignaturas.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Línea base	Meta (2 semestres)	Cómo se mide
P01 · Conozco tareas y condiciones reales	68 %	≥ 75 %	Encuesta pre/post
P02 · Tengo claras las exigencias	69 %	≥ 75 %	Encuesta pre/post
P09 · He comprobado si el trabajo calza conmigo	62 %	≥ 70 %	Encuesta pre/post
P10 · Me siento seguro/a de adaptarme	69 %	≥ 75 %	Encuesta pre/post
Estudiantes con ≥ 1 vivencia real antes de la práctica	No medido	100 %	Bitácoras entregadas

Riesgos y cómo mitigarlos

Riesgo	Mitigación
Visitas difíciles de coordinar	Priorizar empresas ya vinculadas; alternar con visitas virtuales; planificar con un semestre de anticipación.
Sobrecarga de docentes	Insertar en asignaturas existentes y reutilizar la bitácora como evaluación formativa.
Experiencias superficiales	Exigir pauta de observación y reflexión; evaluar con rúbrica.

Estrategia de implementación

Elegir 2 asignaturas ancla por carrera donde ya existan casos y proyectos. Probar la bitácora en una sección antes de generalizarla. Priorizar la **calidad de la reflexión**: los datos sugieren que lo que importa no es solo «haber estado», sino **lo que se aprendió**.

2.5 A4 · Acompañamiento focalizado

Por qué esta área

38 estudiantes (21 %) están en rojo (menos de 3,50); 28 no tienen práctica previa y 10 sí. La práctica previa no «vacuna»: 1 de cada 7 estudiantes con práctica también está en rojo. El tramo 3.°–4.° semestre es el más bajo (a confirmar).

Objetivo. Que ningún estudiante en rojo llegue a la práctica sin un plan de acompañamiento.

Acciones concretas

#	Acción	Qué es, concretamente	Responsable sugerido	Plazo	Costo
4.1	Tamizaje con semáforo	Aplicar la encuesta antes de la práctica y clasificar: verde (≥ 4,20), amarillo (3,50–4,19), rojo (< 3,50).	Coordinación de práctica	Feb–Mar 27	Bajo
4.2	Plan individual para rojos	Conversación de 30 minutos, identificación de 2–3 brechas (por ejemplo, P01, P09, P12) y plan de 5 sesiones de tutoría.	Docente tutor	Mar–Jul 27	Bajo
4.3	Seguimiento quincenal	Para amarillos y rojos, contacto cada 15 días durante las primeras semanas de práctica (criterio del informe metodológico).	Docente tutor	En práctica	Bajo
4.4	Talleres de nivelación	Para rojos: talleres cortos antes o durante las dos primeras semanas (comunicación, manejo del error, pedir ayuda).	Docentes de comunicación	Previo a práctica	Microproyecto
4.5	Reconexión 3.°–4.° semestre	Una actividad de contacto laboral en cada semestre de este tramo (visita, charla o proyecto breve).	Jefaturas de carrera	Ago–Dic 27	Medio
4.6	Revisión del criterio	No segregar por práctica previa; reevaluar el criterio cuando haya datos pre/post.	Comité del proyecto	Dic 27	Bajo

Beneficios esperados

- Detección temprana y apoyo antes de que aparezcan problemas en la empresa.
- Menor riesgo de mala experiencia o abandono de práctica.
- Mejor uso de horas de tutoría (se focalizan donde se necesitan).

Indicadores de seguimiento

Indicador	Línea base	Meta (2 semestres)	Cómo se mide
% de estudiantes en rojo	21 %	≤ 12 %	Semáforo en pretest y postest
% de rojos con plan de acompañamiento	No medido	100 %	Registro de tutorías
Promedio global	3,87	≥ 4,05	Encuesta pre/post
Diferencia 3.°–4.° vs. resto	-0,16	≈ 0	Encuesta pre/post

Riesgos y cómo mitigarlos

Riesgo	Mitigación
Estigmatizar a quienes están en rojo	Presentar el semáforo como «señal de apoyo», comunicarlo en privado, no publicar listas.
Falta de horas docentes	Priorizar a rojos; agrupar tutorías en sesiones pequeñas de 3–4 estudiantes.
Que el semáforo refleje solo modestia	Complementar con evaluación de tutor y conversación individual.

Estrategia de implementación

Comenzar con los 38 estudiantes que hoy están en rojo (si siguen en el programa) y evaluar el efecto en el postest. Priorizar un formato grupal de tutoría para no multiplicar horas.

2.6 A5 · Competencias de empleabilidad

Por qué esta área

Explicar con claridad (P04 = 68 %) y elegir el método adecuado para la empresa (P06 = 66 %) están bajo la meta. En los comentarios, comunicación y oratoria (22), inglés (20), preparación para entrevistas y CV (19), herramientas como ERP y Excel (19), y legislación laboral (6) son los apoyos más pedidos.

Objetivo. Que los estudiantes comuniquen con claridad, se presenten profesionalmente y usen las herramientas que encontrarán en la empresa.

Acciones concretas

#	Acción	Qué es, concretamente	Responsable sugerido	Plazo	Costo
5.1	Taller de comunicación estructurada	8 horas: explicar lo técnico a personas no técnicas, marco SCQA (Situación, Complejidad, Pregunta, Respuesta), presentaciones breves y retroalimentación entre pares.	Docentes de comunicación	Abr–Jun 27	Bajo
5.2	Taller entrevista, CV y LinkedIn	4 horas con simulaciones de entrevista por competencias y revisión de CV.	Docentes + empresas	Mar–Abr 27	Microproyecto
5.3	Módulo de legislación laboral básica	2–4 horas: contratos, remuneraciones, derechos y deberes en práctica.	Docente de RR. HH.	Abr 27	Bajo
5.4	Inglés técnico	Revisar la oferta de talleres de inglés (incluido horario vespertino); explorar un módulo de inglés para comercio exterior y logística.	Dirección de Escuela	Ago–Dic 27	Mayor
5.5	Herramientas reales	Talleres de Excel avanzado y Power BI; evaluar licencias o programas educativos para ERP (SAP, Softland) y su uso en laboratorio.	Jefaturas + TI	Ago–Dic 27	Mayor
5.6	Inclusión laboral	Sensibilización y lengua de señas básica (opcional; 4 menciones).	Vinculación con el Medio	Ago–Dic 27	Microproyecto

Beneficios esperados

- Mejor integración al equipo y comprensión de lo que se dice y se pide.
- Menor desfase entre aula y empresa.
- Mayor confianza para entrevistas y primeras semanas de trabajo.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Línea base	Meta (2 semestres)	Cómo se mide
P04 · Explico temas técnicos con claridad	68 %	≥ 75 %	Encuesta pre/post
P06 · Sé qué método sirve en la empresa	66 %	≥ 72 %	Encuesta pre/post
Menciones de «inglés» y «herramientas» como apoyo pedido	20 y 19	< 10 cada una	Siguiente levantamiento abierto
Asistencia a talleres	No medido	≥ 70 % del curso objetivo	Listas de asistencia

Riesgos y cómo mitigarlos

Riesgo	Mitigación
Costo de licencias e inglés	Explorar convenios y programas educativos existentes antes de comprar; priorizar herramientas gratuitas o de uso libre.
Talleres poco aplicados	Evaluación con casos reales y práctica; invitar a empresas.
Superposición con asignaturas	Mapear los resultados de aprendizaje y evitar duplicar contenidos.

Estrategia de implementación

Comenzar por lo de costo bajo (5.1–5.3) en el primer semestre y dejar 5.4–5.5 para el segundo, una vez revisados convenios, licencias y oferta ya disponible.

2.7 A6 · Gobernanza y mejora continua

Por qué esta área

Sin responsables claros ni ciclo de revisión, las acciones se diluyen. Además, el Informe Metodológico propone institucionalizar el modelo solo si la hipótesis se confirma; los datos actuales sugieren **perfeccionar y evaluar** antes de escalar.

Objetivo. Contar con un comité pequeño, un tablero de indicadores y un ciclo semestral de decisiones basadas en evidencia.

Acciones concretas

#	Acción	Qué es, concretamente	Responsable sugerido	Plazo	Costo
6.1	Comité La Puerta	Comité de 5–6 personas: Dirección de Escuela, jefaturas, coordinación de práctica, Vinculación con el Medio, analista de datos y un estudiante representante; reunión mensual de 45 minutos.	Dirección de Escuela	Nov 26	Bajo

#	Acción	Qué es, concretamente	Responsable sugerido	Plazo	Costo
6.2	Tablero de indicadores	Planilla/tablero con los indicadores de este manual, actualizado cada semestre con los scripts del repositorio.	Analista de datos	Dic 26	Bajo
6.3	Ciclo semestral	Planificar → hacer → medir → ajustar (PDCA): revisión al inicio, a mitad y al cierre del semestre.	Comité	Cada semestre	Bajo
6.4	Criterios de escalamiento	Definir qué debe ocurrir para escalar (ver Sección 6.2).	Comité	Mar 27	Bajo
6.5	Comunicación	Devolver resultados a estudiantes, docentes y empresas con el Manual de resultados y la infografía.	Comité	Dic 26	Bajo

Beneficios esperados

- Decisiones oportunas, con responsables claros.
- Transparencia con estudiantes y empresas.
- Aprendizaje acumulado de cada cohorte.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Línea base	Meta (2 semestres)	Cómo se mide
Reuniones del comité realizadas	0	≥ 80 % de las programadas	Actas
Indicadores actualizados a tiempo	0	100 %	Tablero
Devolución de resultados a estudiantes	No realizada	1 por semestre	Registro de comunicación

Riesgos y cómo mitigarlos

Riesgo	Mitigación
Rotación de responsables	Documentar el proceso; mantener el repositorio de código y datos; designar suplentes.
Sobrecarga de reuniones	Reuniones breves con agenda fija; trabajo asincrónico entre sesiones.

Estrategia de implementación

Reutilizar los scripts del repositorio: un solo comando regenera cifras y gráficos con una base nueva. El tablero puede iniciarse en una planilla y, más adelante, conectarse a Power BI.

2.8 Indicadores de seguimiento (tablero maestro)

El siguiente tablero reúne los indicadores clave, con su línea base (esta encuesta), una meta referencial a dos semestres y el tipo de seguimiento. Las metas son **propuestas del equipo analista** y deben validarse con la Dirección de Escuela.

Indicador	Línea base	Meta	Fuente	Tipo
P12 · Red de contactos	41 %	60 %	Encuesta pre/post	Resultado
P11 · Sé cómo contactar a profesionales	64 %	72 %	Encuesta pre/post	Resultado
P01 · Conozco tareas reales	68 %	75 %	Encuesta pre/post	Resultado
P02 · Claridad de exigencias	69 %	75 %	Encuesta pre/post	Resultado
P09 · Comprobé que el trabajo calza	62 %	70 %	Encuesta pre/post	Resultado
P10 · Seguridad de adaptarme	69 %	75 %	Encuesta pre/post	Resultado
P04 · Explico lo técnico con claridad	68 %	75 %	Encuesta pre/post	Resultado
P06 · Método adecuado para la empresa	66 %	72 %	Encuesta pre/post	Resultado
Promedio global	3,87	≥ 4,05	Encuesta pre/post	Resultado
% de estudiantes en rojo	21 %	≤ 12 %	Semáforo	Resultado
Registros con código, momento y grupo	0 %	100 %	Base de datos	Proceso
Estudiantes con ≥ 1 vivencia real	No medido	100 %	Bitácoras	Proceso
Contactos profesionales por estudiante	No medido	≥ 3	Bitácora	Proceso
Evaluación del tutor de empresa (1–5)	No medido	≥ 4,0	Rúbrica tutor	Impacto

Cadencia de seguimiento

Frecuencia	Qué se revisa	Quién
Mensual	Indicadores de proceso: asistencia, cobertura, actividades realizadas.	Comité
Semestral	Indicadores de resultado: encuesta pre/post, semáforo, comparación con grupo control.	Comité + analista
Anual	Impacto: evaluación del tutor, continuidad en práctica, empleabilidad a 6 meses, costo por estudiante.	Dirección de Escuela

2.9 Cronograma referencial

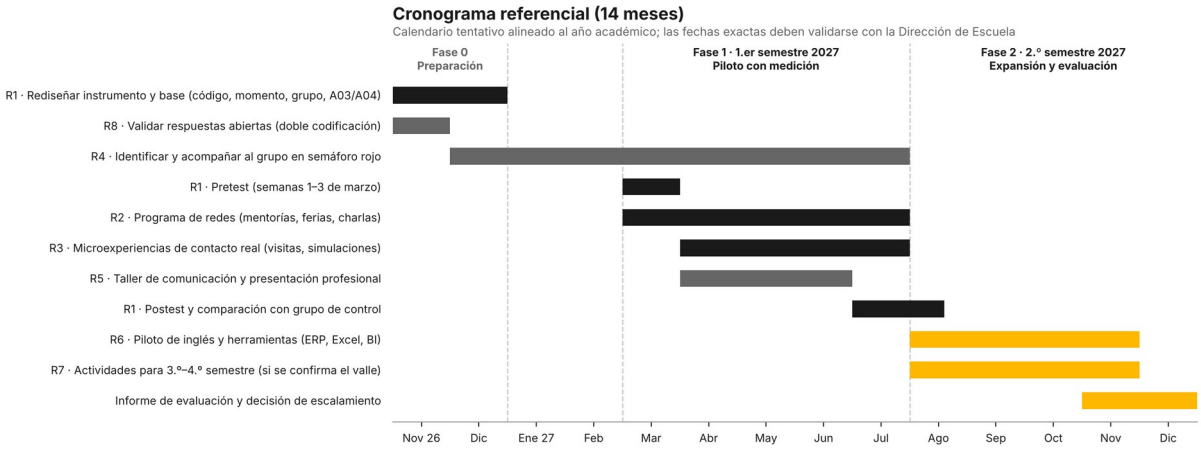


Figura 2. Cronograma de 14 meses (noviembre 2026 – diciembre 2027).

Hito	Cuándo	Producto
Rediseño del instrumento y de la base	Nov–Dic 2026	Formulario con campos obligatorios, A03/A04 y POST_EXP1
Constitución del comité y tablero	Nov–Dic 2026	Acta de constitución; tablero inicial
Pretest	Marzo 2027	Línea base pareada por código, con grupo de comparación
Ejecución de actividades de redes, contacto real y comunicación	Mar–Jul 2027	Actividades con registro de asistencia y bitácoras
Postest y comparación	Julio 2027	Informe de cambios pre/post vs. grupo de comparación
Expansión selectiva (inglés, herramientas, 3.°–4.° semestre)	Ago–Dic 2027	Pilotos con indicadores
Informe de evaluación y decisión de escalamiento	Dic 2027	Decisión del comité con criterios previos

2.10 Estrategias de implementación

6.1 Gobernanza y roles

Rol	Responsabilidad
Dirección de Escuela	Patrocinio, asignación de horas y recursos, decisión de escalamiento.
Jefaturas de carrera	Integrar actividades en asignaturas; coordinar visitas y mini-proyectos.
Coordinación de práctica	Tamizaje, seguimiento de estudiantes en rojo, evaluación de tutor.
Vinculación con el Medio	Relación con empresas socias, egresados y directorio de contactos.
Analista de datos	Medición, tablero y reportes (scripts del repositorio).
Representante estudiantil	Retroalimentación de las actividades; vocería hacia sus compañeros.

6.2 Criterios para escalar (decisión de continuar, ajustar o detener)

Criterio	Umbral sugerido	Decisión
Efecto en el índice global (diferencia en diferencias, pre/post vs. control)	≥ +0,20 puntos con intervalo de confianza que no incluya 0	Escalar
Red de contactos (P12)	≥ 60 % de acuerdo en el grupo La Puerta	Escalar la línea de redes
Satisfacción con las actividades	≥ 4,0 de 5	Mantener / ajustar
Cobertura de medición pareada	≥ 70 %	Resultados interpretables
Costo por estudiante	Dentro del presupuesto fijado por la Escuela	Escalar solo si es sostenible
Efecto nulo o negativo en dos mediciones	Sin cambio o deterioro	Rediseñar o detener

6.3 Gestión de riesgos transversales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Sobrecarga de docentes y estudiantes	Alta	Alto	Integrar a asignaturas existentes; privilegiar acciones de bajo costo; priorizar.
Baja participación en pre/post	Media	Alto	Aplicar en clase; recordatorios; incentivos simbólicos.
Empresas con baja disponibilidad	Media	Medio	Convenios con anticipación; formatos cortos y virtuales.
Interpretar mal el semáforo	Media	Medio	Formación breve para tutores; comunicación empática.
Datos personales	Baja	Alto	Códigos seudonimizados; acceso restringido; consentimiento.
Expectativas desmedidas sobre el programa	Media	Medio	Comunicar que se está evaluando y que los resultados se compartirán.

6.4 Comunicación

- **A estudiantes:** devolver los resultados con lenguaje simple (infografía y manual); explicar qué cambiará y por qué.
- **A docentes:** presentar los hallazgos y pedir su participación en 2 asignaturas ancla por carrera.
- **A empresas socias:** compartir los resultados y proponer formatos de colaboración breves.
- **Cierre del ciclo:** al terminar el semestre, informar qué funcionó, qué se ajustó y qué sigue.

3. CONCLUSIÓN

3.1 Conclusión y próximos pasos

El plan reúne ocho recomendaciones (R1 a R8) en seis áreas. Tres ideas ordenan su ejecución: (1) **medir bien desde el inicio**, porque sin código, momento y grupo no se podrá demostrar el efecto de La Puerta; (2) **acercar el trabajo real a todos los estudiantes** mediante redes, simulaciones, visitas y proyectos breves, que es lo que los datos y los propios estudiantes señalan; y (3) **focalizar el acompañamiento por necesidad** (semáforo y brechas específicas) y no por el solo hecho de tener o no práctica previa.

Los próximos pasos inmediatos son constituir el comité, corregir el formulario de medición (costo cero) y definir el grupo de comparación para el pretest de marzo de 2027. Las metas y costos son propuestas del equipo analista que deben validarse con la Dirección de Escuela.

4. REFERENCIAS

Referencias en formato APA 7, ordenadas alfabéticamente. Las dos últimas son documentos internos del proyecto. Las referencias académicas fueron seleccionadas por la herramienta de IA a partir de su conocimiento de la literatura y **no se verificaron en línea durante esta sesión**: conviene confirmar volumen, páginas y DOI antes de una publicación formal.

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research*. Rand McNally.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2.ª ed.). Lawrence Erlbaum.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, *16*(3), 297–334.

Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, *78*(6), 1360–1380.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, *6*(2), 65–70.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.

Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of Vocational Behavior*, *45*(1), 79–122.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research. *Journal of Applied Psychology*, *88*(5), 879–903.

Sullivan, G. M., & Artino, A. R. (2013). Analyzing and interpreting data from Likert-type scales. *Journal of Graduate Medical Education*, *5*(4), 541–542.

Tomlinson, M. (2017). Forms of graduate capital and their relationship to graduate employability. *Education + Training*, *59*(4), 338–352.

Yorke, M. (2006). *Employability in higher education: What it is – what it is not*. Higher Education Academy.

Duoc UC, Escuela de Administración y Negocios, Sede San Bernardo (2026). *Proyecto La Puerta: Informe metodológico y análisis prospectivo de brechas en habilidades blandas para la práctica profesional* [documento interno].

Duoc UC (2026). *Proyecto La Puerta: Base de datos y matriz de análisis (20261009_1658)* [base de datos interna, no publicada].

5. ANEXOS

5.1 Plantillas y protocolos

Anexo A. Plantilla de microproyecto (≤ $150.000 CLP)

Campo	Qué completar
Nombre de la actividad	
Área y recomendación (A1–A6, R1–R8)	
Brecha que atiende (indicador y línea base)	
Descripción (qué se hará, para quiénes, cuántas personas)	
Resultado de aprendizaje o asignatura vinculada	
Responsable y equipo	
Fecha y duración	
Presupuesto (colación, materiales, difusión, otros)	
Indicadores y forma de medición	
Riesgos y mitigación	
Evidencia a recolectar (asistencia, bitácora, fotos con consentimiento, encuesta breve)	
Retroalimentación esperada y ajustes para la próxima vez	

Anexo B. Protocolo de evaluación pre/post con grupo de comparación

1. **Diseño:** cuasi-experimental con grupo de comparación no equivalente, medición antes y después en ambos grupos (Campbell y Stanley, 1963).
2. **Asignación:** por sección completa; los grupos deben ser parecidos en carrera, semestre y práctica previa; registrar esas variables.
3. **Medición:** misma encuesta (con A03/A04 corregidos) en las semanas 1–3 y en la última semana del semestre; código único obligatorio.
4. **Tamaño de muestra de referencia:** para detectar una diferencia de 0,3 desviaciones estándar entre grupos (≈ 0,2 puntos en el índice global), con 80 % de poder, 5 % de significación y una correlación pre–post asumida de 0,6, se necesitan unos **110 estudiantes por grupo** (cálculo aproximado con

ajuste por la medición inicial; Cohen, 1988). **[HIPÓTESIS]** La correlación pre–post debe verificarse con datos propios.

5. **Análisis:** comparar el postest entre grupos ajustando por el pretest y por práctica previa y año; informar tamaño del efecto e intervalos de confianza; corregir por comparaciones múltiples (Holm, 1979).
6. **Indicadores de calidad:** emparejamiento ≥ 70 %; comparar a quienes respondieron ambos momentos con quienes no, para ver si hay sesgo de desgaste.
7. **Complemento:** evaluación del tutor de empresa y respuestas abiertas codificadas por dos personas.

Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial

Este documento se elaboró con apoyo de Inteligencia Artificial

Se utilizó **Claude (Anthropic), modelo de IA generativa**, como herramienta de apoyo para: (1) limpiar y calcular los resultados de la base de datos con código reproducible; (2) proponer acciones, indicadores, cronograma y criterios de decisión a partir de los hallazgos; (3) redactar, organizar y diseñar los gráficos y diagramas; y (4) clasificar preliminarmente las respuestas abiertas por temas.

La IA no reemplaza el juicio experto. La codificación temática automática es preliminar y debe ser validada por una persona (idealmente con doble codificación). Las interpretaciones, decisiones y recomendaciones deben ser revisadas y asumidas por el equipo responsable del Proyecto La Puerta antes de su difusión institucional.

No se incluyeron nombres, correos ni códigos de estudiantes. Las citas textuales son anónimas.
